

# Proje tanım dokümanı

ecom




# *SimulTrain*

# Proje tanım dokümanı

Proje ismi	<b>e-com</b>
Yaklaşık zaman	11 hafta
Kilometre taşı	1. Şartnamenin onaylanması 2. Yazılım Prototipi hazır 3. Testler tamamlandı 4. Hizmete girme aşaması tamamlandı
Ekip	-Selin, Münir ve Turan - Gerekli olan diğer kişiler
Tanım	Sene başında tanımlanan pazarlama stratejisine göre, yönetim müşterilerine internet üzerinden interaktif bir hizmet vermek istiyor. Bu sistem müşterilere siparişlerini, müşteri hizmet bölümüne veya muhasebe bölümüne ihtiyaç duymadan takip ve kontrol etme hakkı verecek. Proje için, aktiviteleri içeren taslak zaman çizelgesi ve bütçe hazırlandı. Çekirdek ekip oluşturuldu.


## Organizasyon Şeması

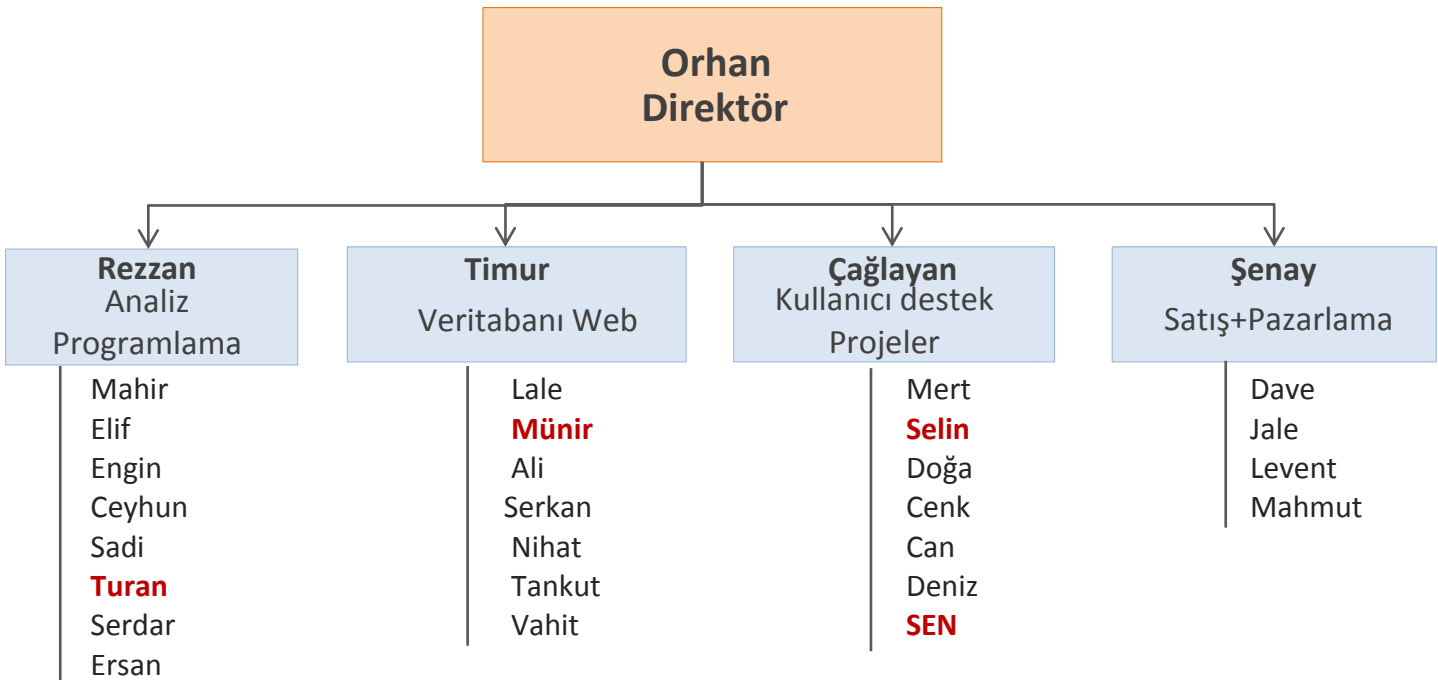

Proje aktiviteleri	Çalışan sayısı	Tahmini süre (günler)	Depends on previous activities	Gereken beceriler				
				Web Tasarımı	Veritabanı	Programlama	İş	Satış + Pazarlama
1 Şartname	2	5	—	2			5	3
2 Kullanıcı Arayüzü	1	7	1	5			2	
3 e-Ödeme Konsepti	2	10	1	3	1		4	3
4 Veritabanı Tasarımı	2	12	1	1	6	3		
5 Yazılım Prototipi	2	8	3, 4	4	3	4		
6 Yönetim Araçları	2	13	2, 5	1	2	4	3	
7 Kullanılabilirlik Testleri	4	15	5	2	1		2	
8 Çevrimiçi Yardım	3	14	5	1		3	2	
9 Aktarım Arayüzü	3	5	4	2	5	2		
10 Veri Aktarımı	1	10	6, 9		3		2	
11 Pazarlama Planı	2	11	1				4	6
12 BT Geliştirme	3	6	5	3	3	5		
13 Fiyatları Oluşturmak	4	11	11				3	5
14 Fonksiyonel Testler	1	5	7, 12, 13	1		3		
15 Uygulama Testi	3	3	8, 10, 14	2		1	2	
16 Belgeleme	1	22	2	3	1	3	2	
17 İşlemi Başlat	4	2	15, 16	1		4	3	

Kaynaklar	Saatlik ücret	Proje için müsait olma, %	haftadan itibaren müsait	Beceriler				
				Web Tasarımı	Veritabanı	Programlama	İş	Satış + Pazarlama
Mert	86	100%	4	3	1	2	2	
Lale	160	100%	2	6	5	6	3	
Mahir	102	100%	4	3	2	4		2
Elif	87	80%	3	2	3	3		
Engin	89	100%	6	1		4		1
Münir	89	90%	1	2	4	2		
Ali	135	80%	2	6	3	5	2	
Can	125	100%	3	4	6	5		
Levent	97	100%	2	1	1		4	6
Serdar	70	70%	3	2		4		
Mahmut	89	100%	3	1			5	5
Sadi	175	100%	4	5	5	6	3	1
Nihat	128	80%	2	6	4	4	1	
Selin	151	80%	1	5	3	4	5	3
Ersan	58	100%	3	3		3		
Turan	97	100%	1	2		4	3	

# Aktivite Ağ Şeması

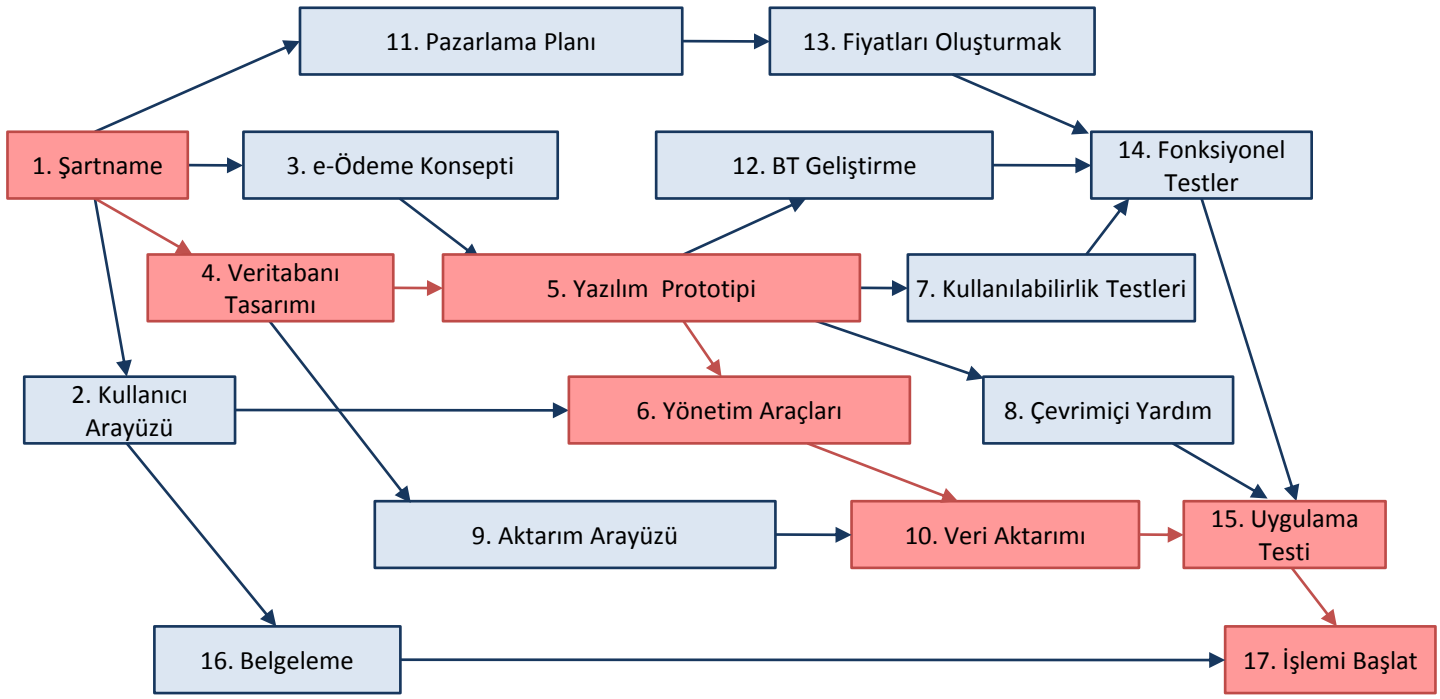

# Gantt Şeması

