

Descripción del proyecto

ecom




SimulTrain

Descripción del proyecto

Nombre del proyecto	e-com
Duración estimada	11 semanas
Hitos	<ol style="list-style-type: none">1. Especificaciones validadas2. Prototipo del Software listo3. Pruebas completadas4. Deployment completed
Equipo	<ul style="list-style-type: none">– Serena, Federico y Vicente– Otros colaboradores según las necesidades
Descripción	De acuerdo con la estrategia de marketing definida al inicio de año, la dirección desea poner al alcance de su clientes un servicio interactivo en línea. Esto permitirá a los clientes realizar pedidos y darles seguimiento sin la intervención del servicio de atención al cliente ni del departamento de contabilidad. Para este proyecto, se fijó una planificación tentativa con la lista de actividades, presupuesto y tiempo requerido. El equipo base se encuentra ya definido.

Organigrama

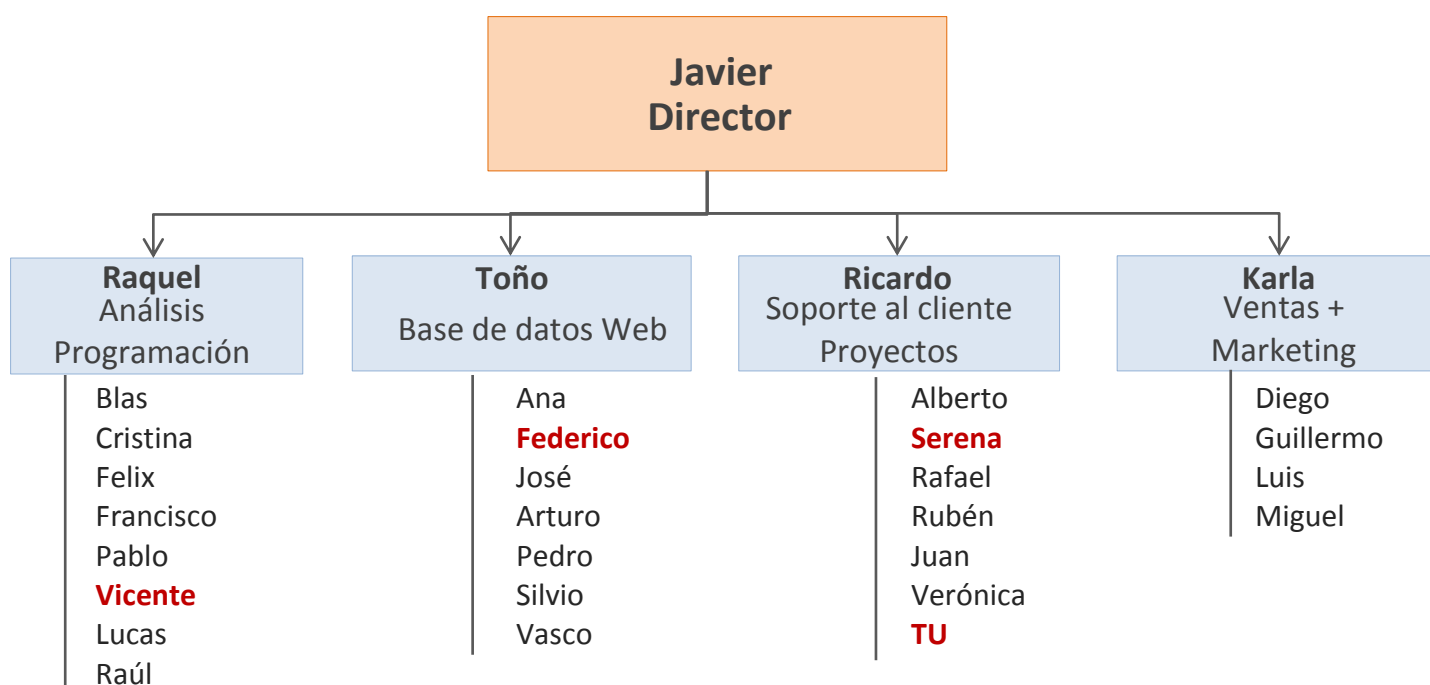

	Actividades del proyecto	N° de personas	Duración estimada (días)	Depende de las actividades anteriores	Competencias necesarias				
					Diseño Web	Base de datos	Programación	Negocios	Ventas + Marketing
1	Especificaciones	2	5	—	2			5	3
2	Interfaz de usuario	1	7	1	5			2	
3	Conceptos de pago en línea	2	10	1	3	1		4	3
4	Diseño de bases de datos	2	12	1	1	6	3		
5	Software Prototipo	2	8	3, 4	4	3	4		
6	Herramientas administrativas	2	13	2, 5	1	2	4	3	
7	Pruebas de usabilidad	4	15	5	2	1		2	
8	Ayuda en línea	3	14	5	1		3	2	
9	Interfaz de importación	3	5	4	2	5	2		
10	Importación de datos	1	10	6, 9		3		2	
11	Plan de marketing	2	11	1				4	6
12	Desarrollo informático	3	6	5	3	3	5		
13	Definición de precios	4	11	11				3	5
14	Pruebas funcionales	1	5	7, 12, 13	1		3		
15	Test de aplicación	3	3	8, 10, 14	2		1	2	
16	Documentación	1	22	2	3	1	3	2	
17	Iniciar operación	4	2	15, 16	1		4	3	

Tabla de recursos	costo horario	Disponible para el proyecto	Disponible a partir de la semana	Competencias				
				Diseño Web	Base de datos	Programación	Negocios	Ventas + Marketing
Alberto	86	100%	4	3	1	2	2	
Ana	160	100%	2	6	5	6	3	
Carlos	102	100%	4	3	2	4		2
Cristina	87	80%	3	2	3	3		
Felix	89	100%	6	1		4		1
Federico	89	90%	1	2	4	2		
José	135	80%	2	6	3	5	2	
Juan	125	100%	3	4	6	5		
Luis	97	100%	2	1	1		4	6
Marcelo	70	70%	3	2		4		
Miguel	89	100%	3	1			5	5
Pablo	175	100%	4	5	5	6	3	1
Pedro	128	80%	2	6	4	4	1	
Serena	151	80%	1	5	3	4	5	3
Raúl	58	100%	3	3		3		
Vicente	97	100%	1	2		4	3	

Red de Actividad

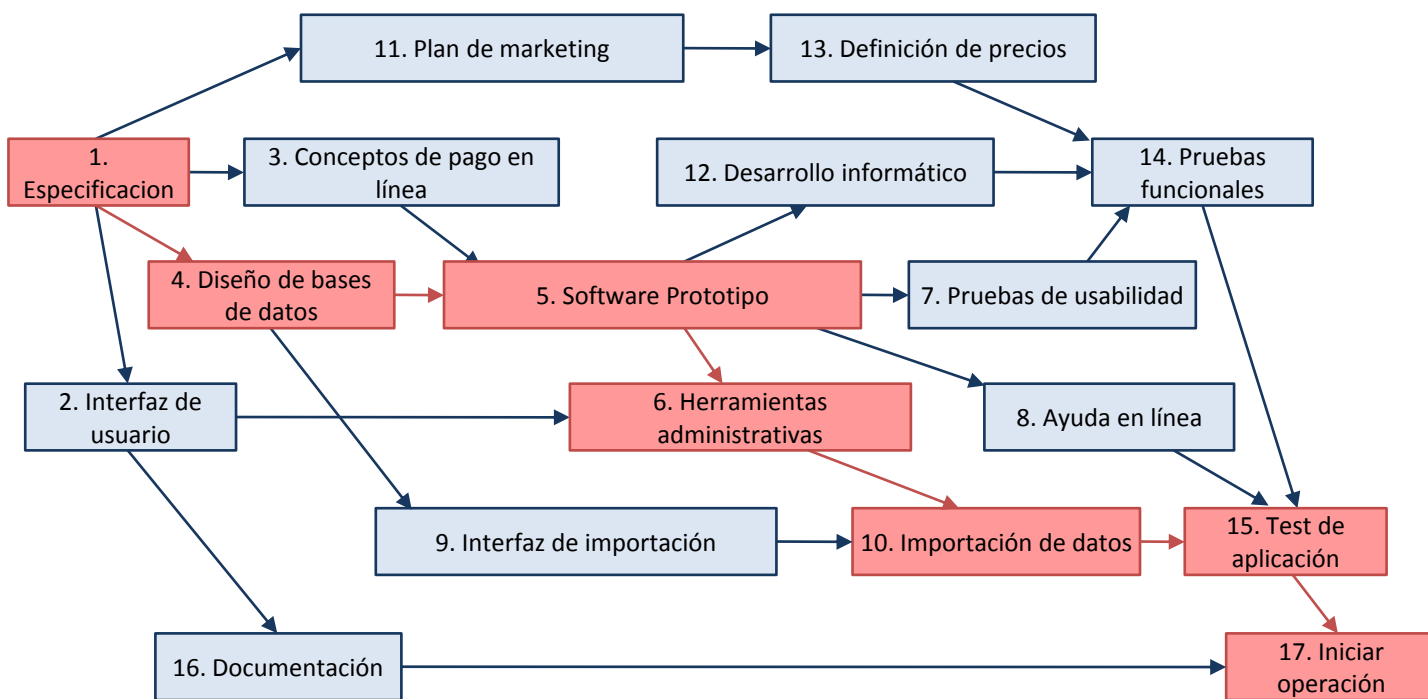


Diagrama de Gantt

