

Описание проекта

agilehybrid



SimulTrain

Описание проекта


Проект **Развертывание Интернет сервиса**

Продолжительность проекта 11 недель

Команда
- Сью, Федор и Тимур
- Другие сотрудники, если требуется

Описание
Следуя стратегии, выработанной в начале года, руководство компании хочет обеспечить клиентов Интернет-сервисом. Это позволит им следить за заказами и контролировать их без участия сотрудников компании. Для этого проекта был создан план, определены бюджет, основные промежуточные результаты и сроки. Команда, работающая только на этом проекте, определена.

Структура фирмы

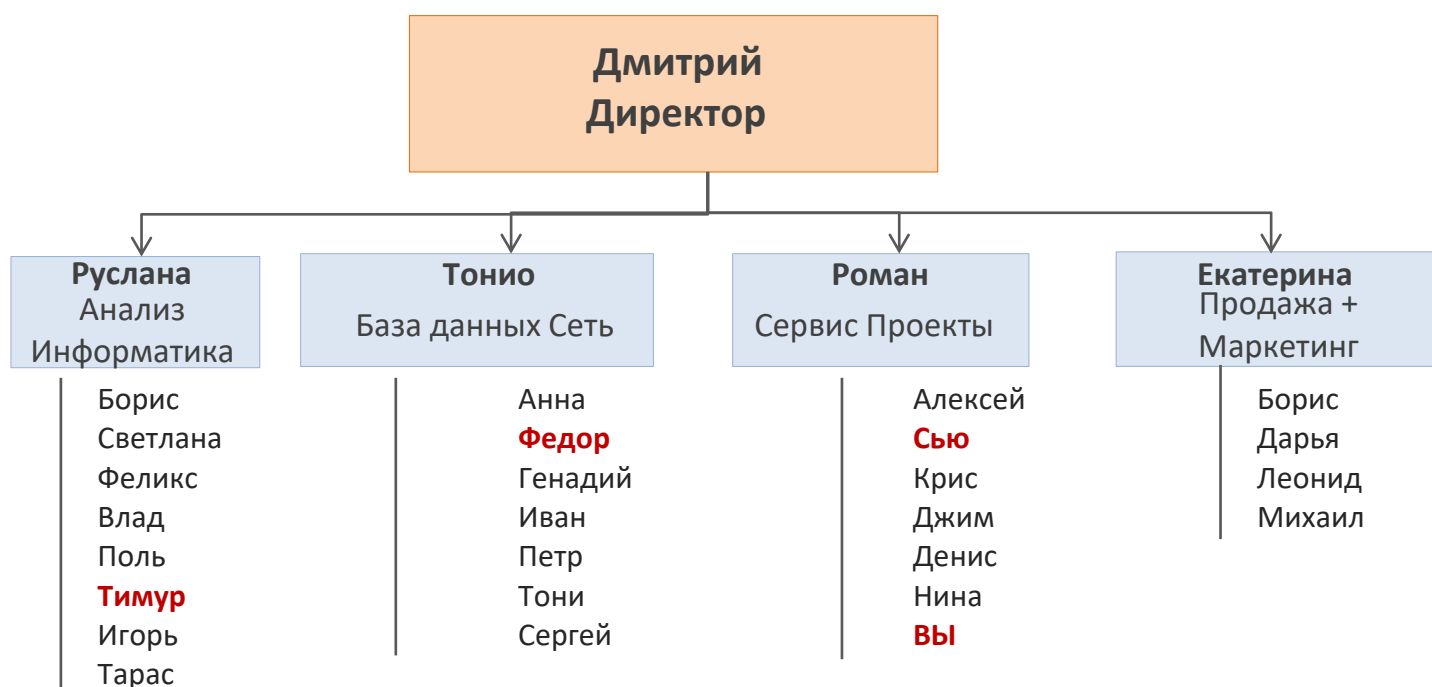

Backlog Items	Число людей	Продолжительность (дня)	Зависит от предыдущих заданий	Требуемая квалификация					
				Веб-дизайн	База данных	Программирование	Бизнес	Продажа + Маркетинг	
1	Разработка решения	2	5	—	2			5	3
2	Концепция поддержки	1	7	—	5			2	
3	Интерфейс Пользователя	2	10	—	4	2		3	1
4	Разработка баз данных	2	12	1	1	6	3		
5	Тест Альфа-версии	2	8	4	3	1	2	2	2
6	Разработка дизайна	2	13	5	5	1	1	3	
7	Разработка поиска	4	15	—	3	2	3		
8	Оптимизация трафика	3	14	—	1	2	4		
9	Инструмент администратора	3	5	—	5	1	2	1	
10	Пробная версия	1	10	6	3		3	2	
11	Стратегия маркетинга	2	11	—				4	6
12	E-shop дизайн	3	6	—	3	1	4	2	
13	Маркетинг-компания	4	11	11				3	5
14	E-shop развертывание	1	5	12	4		1	2	
15	Интеграционный Тест	3	3	10	2		1	2	
16	Развертывание поддержки	1	22	2	5			2	
17	Финальное тестирование	4	2	15	3		3	2	

Персонал	Часовая ставка	Доступен для проекта	Свободен начиная с недели	Квалификация				
				Веб-дизайн	База данных	Программирование	Бизнес	Продажа + Маркетинг
Алексей	86	100%	4	3	1	2	2	
Анна	160	100%	2	6	5	6	3	
Борис	102	100%	4	3	2	4		2
Светлана	87	80%	3	2	3	3		
Феликс	89	100%	6	1		4		1
Фёдор	89	90%	1	2	4	2		
Геннадий	135	80%	2	6	3	5	2	
Денис	125	100%	3	4	6	5		
Леонид	97	100%	2	1	1		4	6
Игорь	70	70%	3	2		4		
Михаил	89	100%	3	1			5	5
Поль	175	100%	4	5	5	6	3	1
Петр	128	80%	2	6	4	4	1	
Сью	151	80%	1	5	3	4	5	3
Тарас	58	100%	3	3		3		
Тимур	97	100%	1	2		4	3	

Сетевой график

